Protokoll - Ortsbegehung

| Projekt | Pilotprojekt "Erstellung eines Vorsorgekonzeptes Hochwasser und Starkregen für die Kreisstadt St. Wendel" | |
|--------------------------------|---|---|
| Auftraggeberin | Kreisstadt St. Wendel, Rathausplatz 1, 66606 St. Wendel | |
| Auftragnehmerin | Ingenieurgesellschaft ProAqua, Turpinstraße 19, 52066 Aachen | |
| Thema | Ortsbegehung Nr. 14 St. Wendel Kernstadt | |
| Termin | 02.06.2020 13:00 – 15:15 | |
| Ort | Kernstadt St. Wendel (Ostteil) der Kreisstadt St. Wendel | |
| Witterung | Sonnig, heiß | |
| Teilnehmerinnen, Teilnehmer | Name | Institution |
| | Herr Hans-Jürgen Rauber | Kreisstadt St. Wendel, Umweltamt, Amtsleiter |
| | Herr Werner Ost | Freiwillige Feuerwehr St. Wendel |
| | Herr Carlos Rubín | Ingenieurgesellschaft ProAqua |
| | Herr Elmar Goffin | Ingenieurgesellschaft ProAqua |
| Stand | 10.06.2020 Fertigstellung durch ProAqua | |
| Anlagen | 1 Übersichtskarte Ortsbegehung Nr. 14 | |











Einlauf Flurgraben:

Der Einlauf des Flurgrabens in den kanalisierten Abschnitt wurde aufgemessen . Der Einlauf war mit Sediment zugesetzt (60% der Querschnittsfläche war verklaust). Grabenaufwärts des Einlauf ist ein Rechen zur Zurückhaltung von Geschwemmsel vorhanden




Schwimmbad:

Oberhalb des Schwimmbadgeländes sind zwei grosse Einläufe (2 x DN600) vorhanden (einer davon der Wendelsborn) sowie 3 Regeneinläufe auf den Liegewiesen (2 davon mit Abfallbehältern zugestellt).







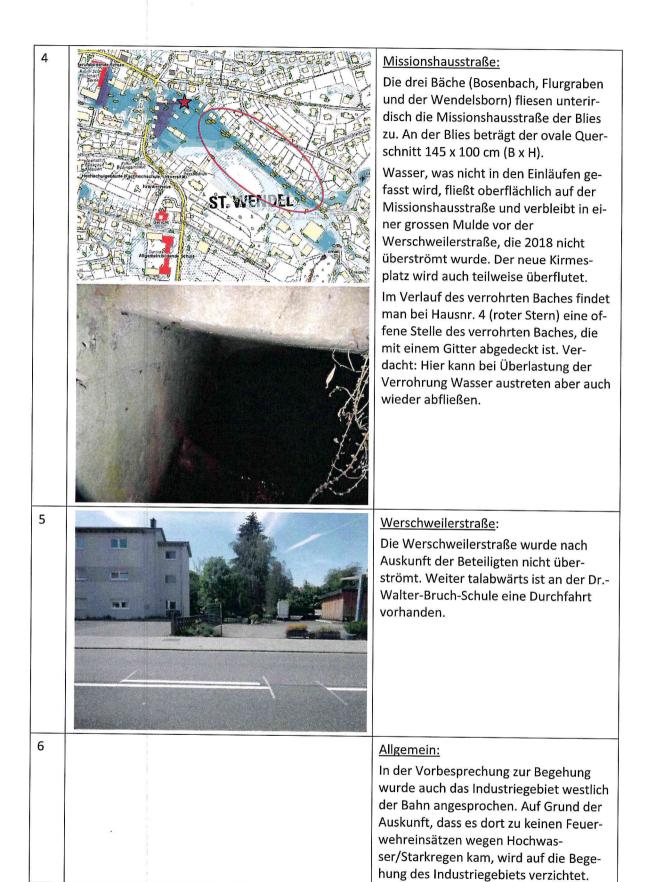

Bei Wendelsb -Aufdem-W Wendelsbor Jenseits Übersichtskarte - Ortsbegehung Nr. 14 Kernstadt 1, Kreisstadt St. Wendel, 02.06.2020 Am Atzelhübel ۵ Gymnasium Wendaliirum
